




### ► Reposición de antena Radioenlace

Se ha repuesto el mástil del emisor de radioenlace que se había doblado por la caída de una rama. Esta antena realiza la maniobra de llenado y parada del aljibe de agua potable desde el **pozo II** de abastecimiento.



▲ Antes

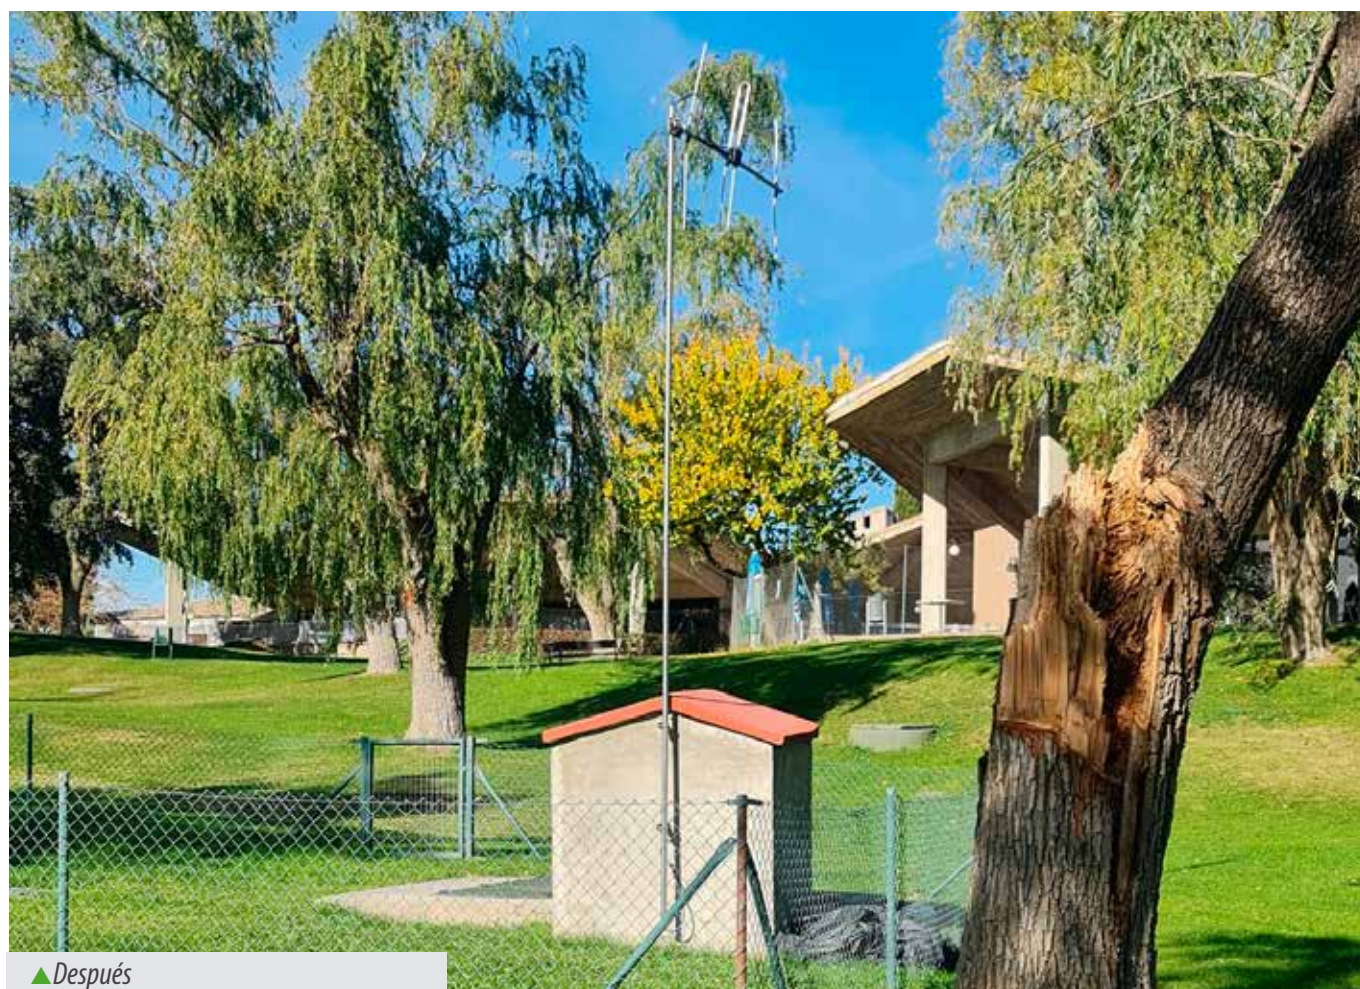

▲ Después



## ► Trabajos forestales

Seguimos con los trabajos forestales de poda y tala de algunos de los ejemplares que implica riesgo de caída o daño. Se ha terminado con el reperfilado de los setos exteriores del vallado perimetral.

Se prevé hacer una quema controlada y autorizada para la eliminación de los residuos generados. De no ser así se realizaría un triturado mecánico y se llevaría a una gestora de este tipo de residuos.



▲ Antes



▲ Después

