





### ► Sustitución y mejoras en la instalación eléctrica Edif. Deportivo. Planta Alta

Se han sustituido todas las líneas eléctricas de iluminación, equipamiento barra y cocina del *Edificio Deportivo* en su planta alta. La nueva instalación se ha sectorizado para mejorar la operativa.


La nueva instalación se ha colocado sobre una canaleta de distribución suspendida, donde se han dispuesto las líneas, cajas de conexiones, luminarias de emergencia etc. La instalación de la canaleta, ha estado condicionada por los parámetros de la sala que son de hormigón y ladrillo visto, esto dificultaba la ocultación de la instalación.

Estos trabajos, la mano de obra técnica, así como los medios auxiliares se han realizado con personal y equipos internos del Club. El plazo de ejecución ha sido superior a 30 días, por el volumen de la reforma.

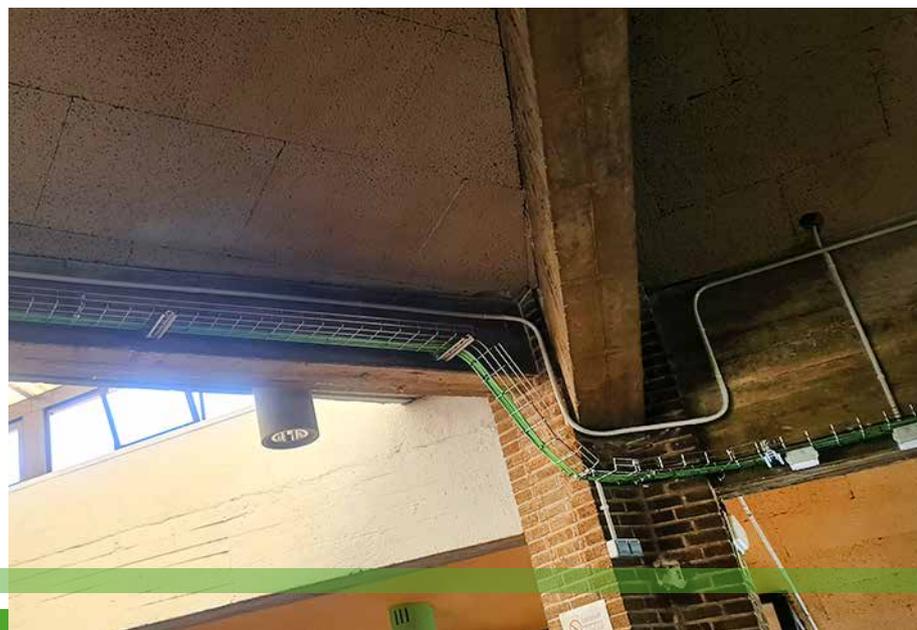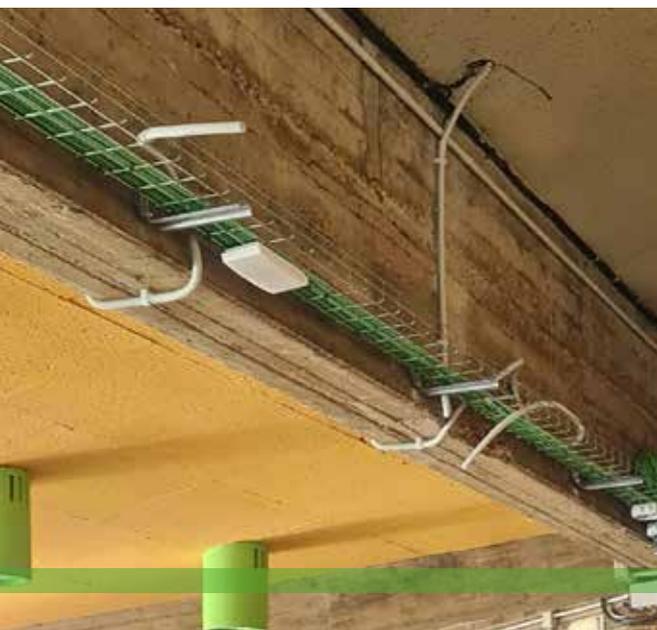

## ► Sustitución de focos sala de cardio

Se han sustituido los focos fundidos y de alto consumo de la sala de máquinas del gimnasio por tecnología LED más eficiente. Para esta instalación hemos necesitado medios auxiliares externos (*elevador*). El personal técnico ha sido interno del *Club*.

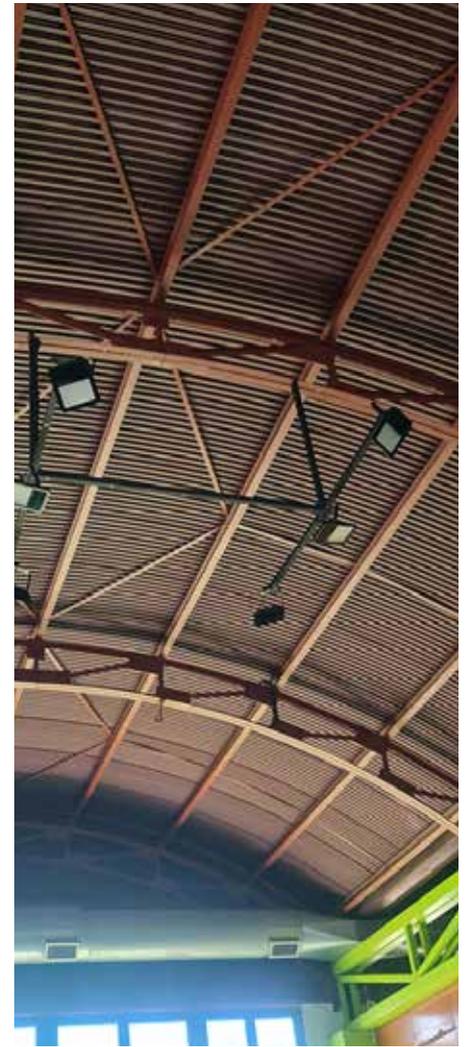

## ► Puerta almacenes cloro

Se ha sustituido una de las puertas del cuarto de cloración de la piscina del *Deportivo* que se había caído por oxidación. La puerta instalada es metálica lacada para aumentar la resistencia. El acabado final será en esmalte verde, igual al edificio.

